

02-077/26-1114/1

26.03.2026. godine

CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA



D.O.O.
VODOVOD
PLJEVLJA

IZVJEŠTAJ O RADU DOO „VODOVOD” PLJEVLJA ZA 2025. GODINU

- PLJEVLJA, mart 2026. godine

SADRŽAJ

1 UVOD.....	4
1.1. Osnovne djelatnosti i ciljevi Društva	4
2 VODOVODNI SISTEM	5
2.1 Tekući radovi u okviru održavanja vodovodnog sistema	5
2.1.1 Održavanje vodovodne mreže	5
2.2 Investicione aktivnosti na unapređenju sistema vodosnabdijevanja	5
2.2.1 Nastavak radova iz prethodne godine u ulicama Vlatka Samardžića i Baja Mirkovića	5
2.2.2 Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu ulice Serdara Janka Vukotića (od Monaka do objekta Radulović prevoza)	6
2.2.3 Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Serdara Janka Vukotića (od objekta Radulović prevoza do restorana Apolon	7
2.2.4 Radovi na izgradnji vodovodne mreže i atmosferske kanalizacije u ulici dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Save Kovačevića do raskrsnice sa Šavničkom ulicom)	7
2.2.5 Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog priključka i priključka za fekalnu kanalizaciju na stambeno-poslovnim objektu u ulici Lovćenska.....	9
2.2.6 Izvedeni radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu Jadranske ulice	10
2.2.7 Izvedeni radovi na rekonstrukciji vodovodnih priključaka u Đurđevdanskoj ulici	12
2.3 Zbirna rekapitulacija izvedenih radova na vodovodnoj mreži.....	12
2.4 Radovi manjeg obima na rekonstrukciji i sanaciji vodovodne mreže	13
3 PROIZVODNJA I KVALITET VODE	14
3.1 Proizvodnja vode	14
3.2 Kvalitet vode	16
3.2.1 Tekuće aktivnosti na kontroli kvaliteta vode	16
4 KANALIZACIONI SISTEM	17
4.1 Tekući radovi u okviru održavanja kanalizacionog sistema	17
4.2 Investicione aktivnosti na unaprijeđenju kanalizacionog sistema.....	17
4.2.1 Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	17
4.2.2 Izvedeni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Deveta	17
4.2.3 Izvedeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u dijelu ulice Oslobođenja	18
4.2.4 Izvedeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije i drenaže u ulici II Proleterska (iza zgrade GM 3)	19
4.2.5 Izvedeni radovi na razdvajanju fekalne i atmosferske kanalizacije u Volođinoj ulici (naselje Kupusište)	19
4.2.6 Izvedeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije na platou manastira Sveta Trojica.....	20
4.2.7 Izvedeni radovi na izgradnji drenažne kanalizacije na gradskom groblju Ravni	21
4.2.8 Izvedeni radovi na izgradnji drenažne kanalizacije na gradskom groblju Ravni (iznad pravoslavnog dijela).....	21
4.2.9 Izvedeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u dijelu ulice dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Jadranska do raskrsnice sa Šavničkom ulicom)	22

4.2.10 Aktivnosti u okviru kratkoročnih mjera na rekonstrukciji i sanaciji kanalizacione mreže	24
4.2.11 Aktivnosti u okviru dugoročnih mjera na rekonstrukciji i sanaciji kanalizacione mreže	25
4.2.11 Aktivnosti na poboljšanju tehničke opremljenosti Društva.....	25
5 FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA U 2025. GODINI.....	27
5.1 Iskaz o finansijskoj poziciji – Bilans stanja na dan 31.12.2025. godine sa uporednim pokazateljima za 2024. i 2023. godinu	27
5.2 Iskaz o ukupnom rezultatu – Bilans uspjeha za period 01.01.2025. – 31.12.2025. godine sa uporednim pokazateljima za 2024. godinu i planom za 2025. godinu	31
5.3 Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2025. god.	34
5.4 Analiza prihoda	35
5.5 Analiza rashoda.....	37
6 ZAKLJUČAK.....	39

1 UVOD

1.1. Osnovne djelatnosti i ciljevi Društva

Osnovna djelatnost Društva je:

- Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- Održavanje vodovodnih sistema na teritoriji opštine Pljevlja
- Uklanjanje otpadnih voda
- Inženjerske djelatnosti
- Postavljanje vodovodnih i kanalizacionih sistema

U skladu sa Programom rada za 2025. godinu realizovani su sledeći ciljevi:

- kontinuirano snabdijevanje potrošača vodom za piće;
- prikupljanje i odvođenje otpadnih, fekalnih i atmosferskih voda;
- redovna kontrola kvaliteta vode;
- implementacija HCCP I MEST EN ISO 9001:2016 standarda.

Osnivač društva je Opština Pljevlja, a organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor. Osnovni oblici unutrašnje organizacije Društva su sektori i to: Sektor za tehničko – operativne poslove i Sektor za ekonomsko – pravne poslove.

2 VODOVODNI SISTEM

Društvo je u okviru tekućih radova na planskom i preventivnom održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, a sve u cilju kontinuirane isporuke vode, radilo na realizaciji planiranih ciljeva za 2025. godinu.

2.1 Tekući radovi u okviru održavanja vodovodnog sistema

2.1.1 Održavanje vodovodne mreže

Društvo je u 2025. godini, kao i prethodnih godina, po predviđenoj dinamici sprovodilo aktivnosti na smanjenju gubitaka i održavanju kompletnog sistema vodosnabdijevanja. Zahvaljujući kvalitetnom monitoringu sistema - tj. detekcijom većih gubitaka, mjerenjem protoka, kao i analizom podataka, uspješno je lociran i saniran veliki broj kvarova na vodovodnoj mreži. Broj izvršenih intervencija je na nivou prethodnih godina, sa određenim umanjnjem, a to je oko 1870 – većeg i manjeg obima.


2.2 Investicione aktivnosti na unapređenju sistema vodosnabdijevanja

U sklopu radova na rekonstrukciji glavnih gradskih saobraćajnica, u toku 2025. godine, potpisani su ugovori između Opštine Pljevlja (Direkcija za izgradnju i investicije) - kao investitora i Društva - kao izvođača radova, na osnovu kojih su realizovani sljedeći projekti u centralnom gradskom jezgru, kao i radovi u ruralnim sredinama naše opštine.

2.2.1 NASTAVAK RADOVA IZ PRETHODNE GODINE U ULICAMA VLATKA SAMARDŽIĆA I BAJA MIRKOVIĆA

Na osnovu okončane situacije broj 12-332/25-5011/1 od 25.12.2025. godine kao nastavak radova iz prethodne godine, u ulici Vlatka Samardžića, Društvo je izvelo radove na izgradnji vodovodnog priključka u vrijednosti od **4.300,34 €** sa PDV-om.

Na osnovu okončane situacije broj 12-332/25-5012/1 od 25.12.2025. godine kao nastavak radova iz prethodne godine, u ulici Baja Mirkovića, Društvo je izvelo radove na izgradnji vodovodnog priključka za stambenu zgradu GM 7 u vrijednosti od **7.270,26 €** sa PDV-om.

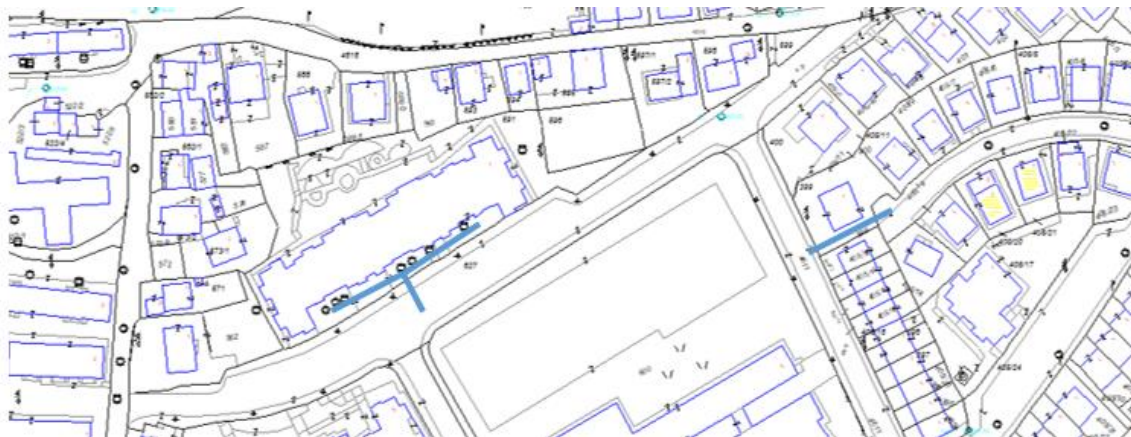

Slika br.1. Nastavak radova iz prethodne godine u ulicama Vlatka Samardžića i Baja Mirkovića

2.2.2 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U DIJELU ULICE SERDARA JANKA VUKOTIĆA (OD MONAKA DO OBJEKTA RADULOVIĆ PREVOZA)

Na osnovu ponude broj 12-332/25-204/1 od 28.01.2025. godine i potpisanog ugovora br.02-332/25-265/1 od 31.01.2025. godine između Direkcije za izgradnju i investicije kao investitora i Društva kao izvođača radova izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Serdara Janka Vukotića. Vrijednost izvedenih radova iznosila je **31.213,80 €** sa PDV-om. Izvedeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže su se odnosili na ugradnju PEHD vodovodnih cijevi DN 110 mm u dužini od **L=215,72 m**; DN 63 u dužini **L=5,33 m**; DN 32 u dužini **L=16,2 m**. Broj individualnih priključaka 6.

Izvedeni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije odnose se na ugradnju PVC kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju DN 250 mm u dužini **L=152,84 m**; PVC DN 160 mm SN4 u dužini od **L=32,53 m**.

Realizacijom ovih radova obezbjeđeno je kvalitetnije vodosnabdjevanje, dok je izgradnjom fekalne kanalizacije obezbjeđeno efikasno odvođenje otpadnih voda do glavnog gradskog kolektora, poboljšanje kvaliteta influenta na PPOV-u, kao i sanitarnu zaštitu životne sredine.



Slika br.2. Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu ulice Serdara Janka Vukotića (od Monaka do objekta Radulović prevoza)

2.2.3 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE SERDARA JANKA VUKOTIĆA (OD OBJEKTA RADULOVIĆ PREVOZA DO RESTORANA APOLON)

Na osnovu ponude broj 12-333/25-123/1 od 04.03.2025. godine i potpisanog ugovora br.02-333/25-123/1 od 05.03.2025. godine između Direkcije za izgradnju i investicije kao investitora i Društva kao izvođača radova izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu ulice Serdara Janka Vukotića. Vrijednost izvedenih radova iznosila je **37.143,65 €** sa PDV-om. Izvedeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže su se odnosili na ugradnju PEHD vodovodnih cijevi DN 110 mm u dužini od **L=261,15 m**; DN 63 u dužini **L=52,79 m**; DN 32 u dužini **L=33,34 m**. Broj individualnih priključaka **15**.

Realizovani radovi na vodovodnoj mreži imali su za cilj zamjenu dotrajalog cjevovoda, povećanje profila, stabilizaciju pritiska, smanjenje gubitaka i kvalitetnije snabdijevanje.




Slika br.3. Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu ulice Serdara Janka Vukotića (od objekta Radulović prevoza do restorana Apolon)

2.2.4 RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI DR SLOBODANA DRAGAŠEVIĆA (OD RASKRSNICE SA ULICOM SAVE KOVAČEVIĆA DO RASKRSNICE SA ŠAVNIČKOM ULICOM)

Na osnovu ponude broj 12-332/25-1692/1 od 29.04.2025. godine i potpisanog ugovora br. 02-332/25-1976/1 od 20.05.2025. godine između Direkcije za izgradnju i investicije kao investitora i Društva kao izvođača radova, izvedeni su radovi na izgradnji vodovodne i atmosferske mreže u ulici dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Save Kovačevića do raskrsnice sa ulicom Šavničkom). Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi

90.938,38 € sa PDV-om. Izvedeni radovi na vodovodnoj mreži su se odnosili na ugradnju PEHD vodovodnih cijevi DN 110 mm u dužini od **L=256,57 m**; DN 63 mm u dužini od **L=33,65 m**; DN 32 mm u dužini od **L=140,98 m**. Broj individualnih priključaka **16**.

Izvedeni radovi na atmosferskoj kanalizaciji odnose se na ugradnju korugovanih cijevi HDP DN/ID 300 SN8 u dužini **L=217,14 m** i ugradnju PVC kanalizacionih cijevi DN 160 SN4 u dužini **L=15,5 m**. Izvršena je i ugradnja AB cijevi ϕ 1000/1000 u dužini **L=14 m**; ϕ 1000/500 u dužini **L=1 m**; ϕ 1000/250 u dužini **L=5 m**. Izrađen je i AB kanal u dužini **L=9 m**. Ugrađena je linijska rešetka opterećenja D400 kN u dužini **L=9 m**.

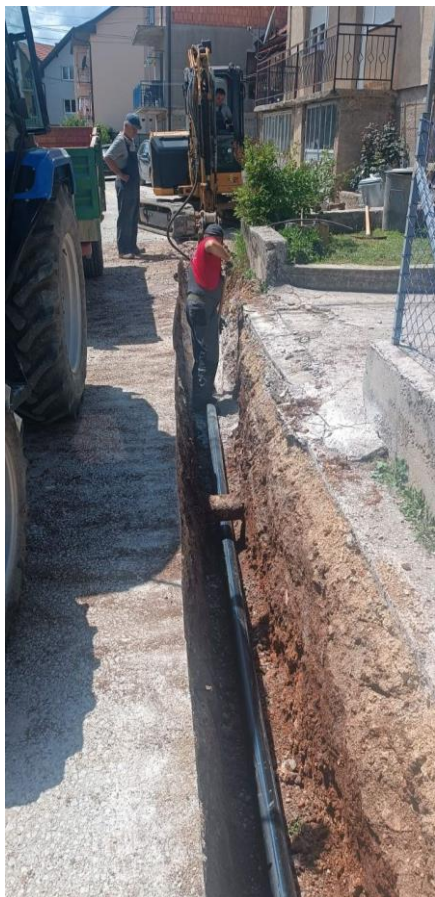

Slika br.4. Radovi na izgradnji vodovodne mreže u ulici dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Save Kovačevića do raskrsnice sa Šavničkom ulicom)



Slika br.5. Radovi na izgradnji atmosfere kanalizacije u ulici dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Save Kovačevića do raskrsnice sa Šavničkom ulicom)

2.2.5 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNOG PRIKLJUČKA I PRIKLJUČKA ZA FEKALNU KANALIZACIJU NA STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU U ULICI LOVČENSKA

Na osnovu ponude br. 12-332/25-2443/1 od 30.06.2025. godine i potpisanog ugovora broj 02-332/25-2444/1 od 30.06.2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji vodovodnog i kanalizacionog priključka za stambeno-poslovni objekat u ulici Lovčenska. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi **3.781,25 €** sa PDV-om.

Izvedeni radovi na izgradnji vodovodnog priključka odnose se na ugradnju vodovodne cijevi PEHD DN 63 mm u dužini od **L=6 m**, dok je za radove na priključku fekalne kanalizacije ugrađena kanalizaciona cijev PVC DN 125 SN4 u dužini **L=3 m**.



Slika br.6. Radovi na izgradnji vodovodnog priključka i priključka za fekalnu kanalizaciju na stambeno-poslovnom objektu u Lovćenskoj ulici

2.2.6 IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU JADRANSKE ULICE

Na osnovu ponude broj 12-332/25-3460/1 od 08.09.2025. godine, izvedeni su radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu Jadranske ulice. Vrijednost izvedenih radova iznosi **38.157,80 €** sa PDV-om. Izvedeni radovi su se odnosili na ugradnju PEHD vodovodnih cijevi DN 110 mm u dužini od **L=270 m**, DN 63 mm u dužini od **L=5 m**; DN 32 mm u dužini od **L=20 m**. Broj individualnih priključaka **5**.

Radovi na izgradnji fekalne i atmosferske kanalizacije odnosili su se na ugradnju PVC cijevi za uličnu kanalizaciju DN 315 u dužini od **L=180 m**, ugradnju kanalizacionih cijevi PVC DN 160 u dužini **L=120 m**.

Realizovani radovi imali su za cilj izgradnju nedostajuće vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije, što ima za cilj kvalitetnije vodosnadbijevanje i odvođenje fekalnih i atmosferskih voda.



Slika br.7. Radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu Jadranske ulice

2.2.7 IZVEDENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNIH PRIKLJUČAKA U ĐURĐEVDANSKOJ ULICI

Na osnovu ponude broj 12-332/25-4724/1 od 09.12.2025. godine, izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovodnih priključaka u Đurđevdanskoj ulici. Vrijednost izvedenih radova iznosi **8.333,27 €** sa PDV-om. Izvedeni radovi su se odnosili na ugradnju PEHD cijevi DN 25 u dužini od **L=390 m**. Ugrađena je i PVC cijev DN 110 mm u dužini od **L=30 m** za uličnu kanalizaciju. Broj vodovodnih priključaka **6**.

Realizacijom ovih radova obezbjeđeno je kvalitetnije vodosnabdjevanje, dok je izgradnjom fekalne kanalizacije obezbjeđeno efikasno odvođenje otpadnih voda do glavnog gradskog kolektora, poboljšanje kvaliteta influenta na PPOV-u, kao i sanitarnu zaštitu životne sredine.

2.3 Zbirna rekapitulacija izvedenih radova na vodovodnoj mreži

Naziv projekta	Dužina glavne i sekundarne mreže u (m)	Vrijednost izvedenih radova (€)
Nastavak radova iz prethodne godine u ulicama Vlatka Samardžića i Baja Mirkovića	izrada priključaka	11.570,60 € sa PDV-om
Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu ulice Serdara Janka Vukotića (od Monaka do objekta Radulović prevoza)	237,25 - vod. 185,37 - fek.kan.	31.213,80 € sa PDV-om
Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Serdara Janka Vukotića (od objekta Radulović prevoza do Apolona)	347,28 - vod.	37.143,65 € sa PDV-om
Radovi na izgradnji vodovodne mreže i atmosferske kanalizacije u ulici dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Save Kovačevića do raskrsnice sa Šavničkom ulicom)	431,20 - vod. 252,64 - atm.kan.	90.938,38 € sa PDV-om
Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog i priključka za fekalnu kanalizaciju na stambeno-poslovnim objektu u ulici Lovćenska	6 - vod. 3 - fek.kan.	3.781,25 € sa PDV-om
Izvedeni radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu Jadranske ulice	295 – vod. 180 – atm. kan. 120 – fek. kan.	38.157,80 € sa PDV-om
Izvedeni radovi na rekonstrukciji vodovodnih priključaka u Đurđevdanskoj ulici	390 - vod. 30 – fek. kan.	8.333,27 € sa PDV-om
Ukupno:	1.706,73 – vod. 432,64 – atm. 338,37 – fek.	221.138,75 € sa PDV-om

Tabela br. 1. Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže

2.4 Radovi manjeg obima na rekonstrukciji i sanaciji vodovodne mreže

Opis poslova i lokacija	Vrijednost izvedenih radova u €
Izrada vodovodnog priključka u ulici Aleksandra Vukovića	1.056,84
Izmještanje vodovodnih priključaka u ulici Kozaračka, ulici Pavla Bulatovića i naselju Gornji Komini	8,289,95
Radovi na rekonstrukciji vodovodnih priključaka u ulici Oslobođenja, za grupu domaćinstava u Kozaračkoj ulici, naselje Deveta, kao i izrada (rekonstrukcija) vodovodnog priključka za zgradu u ulici Jovana Petrića	6.333,92
Sanacija kvara na cjevovodu DN 400 u Borovici i na glavnom dovodnom cjevovodu DN 400 u mjestu Odžak. Sanacija kvara na azbestno-cementnom cjevovodu Dn 350 u mjestu Potpeće i Dn 250 u mjestu Alići	17.818,26
Sanacija kvara na vodovodnom priključku u Tršovoj ulici	1.004,30
Ugradnja vazdušnih ventila na vodovodni sistem MZ Šula	1.210,00
Isključenje i demontaža objekata sa vodovodne mreže u Principovoj ulici (Bezistan)	2.000,13
Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži za crkvu u Krćama	11.536,78
Radovi na vodovodu u Bobovu	2.438,20
Izvedeni radovi na sanaciji rezervoara vodovoda „Vrioce“ MZ Boljanići	2.528,90
Izrada vodovodnog i kanalizacionog priključka u Kosaničkoj ulici	1.869,84
Ukupno	56.087,12

Tabela br. 2. Rekonstrukcija i sanacija vodovodne mreže

Ukupna vrijednost radova - vodovod: 277.225,87 € sa PDV-om.


3 PROIZVODNJA I KVALITET VODE

3.1 Proizvodnja vode

U prilogu se nalaze tabela i grafički prikaz sa ukupno proizvedenom, prihodovanom i neprihodovanom vodom za 2025. godinu.

Godina		Proizvedena m ³	Prihodovana m ³	Neprihodovana m ³
2025	m ³	2 792 943	977 530	1 815 413
	%	100%	35 %	65 %


Tabela br. 3. Proizvedena, prihodovana i neprihodovana voda za 2025. godinu

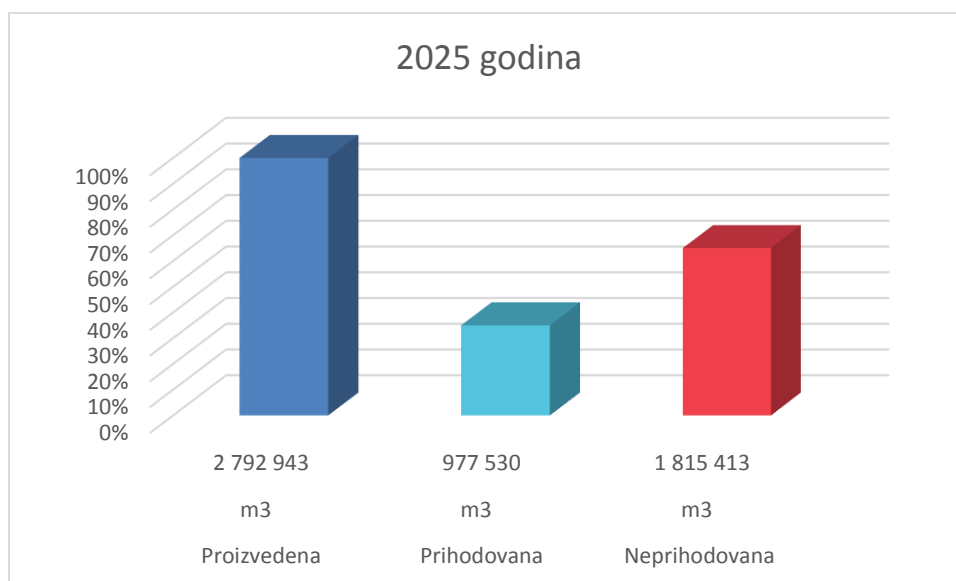

Dijagram br. 1. Proizvedena, prihodovana i neprihodovana voda

Nakon uspješnih projekata rekonstrukcije vodovodne mreže u centralnom jezgru grada prethodnih godina postignuti su pozitivni rezultati u smislu smanjenja gubitaka na distributivnoj mreži. Na osnovu ovog iskustva, sprovode se aktivnosti na rekonstrukciji ostalih zona grada - što će doprinijeti smanjenju gubitaka vode na nivou cjelokupne mreže.

Stoga, u periodu od 2019-2025. godine, u skladu sa idejnim projektom rekonstrukcije distributivnog sistema gradskog vodovoda u Pljevljima rekonstruisane su sljedeće ulice šire zone: Sarajevska, Uroša Ružičića, Boračka, Sutjeska, Zlatiborska, Mojkovačka, D.Obradovića, Avalska, Banijska, Save Dimitrijevića, Vuka Karadžića, RVI, Omer-bega Bajrovića, Mila Peruničića, Bihaćka, Baja Mirkovića, Vlatka Samardžića, dio Njegoševe, Šavnička, Deveta, Serdara Janka Vukotića, dr Slobodana Dragaševića, Jadranska.

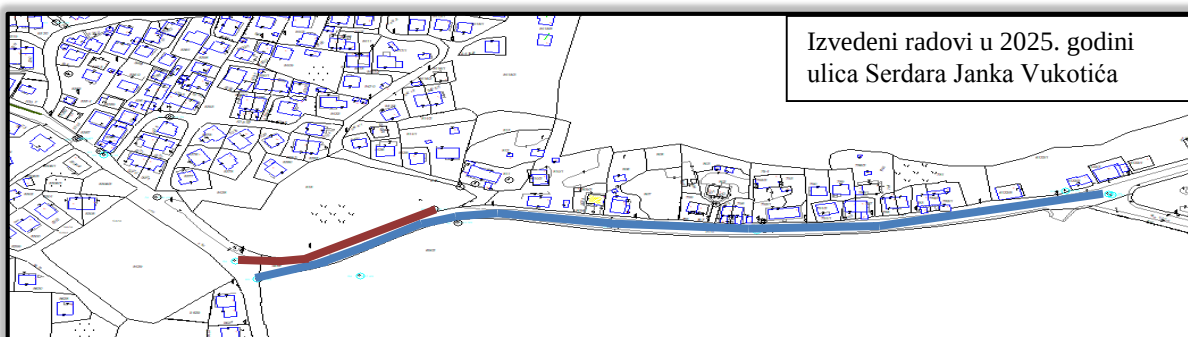

Slika br.8. Šematski prikaz ulica koje su rekonstruisane u 2025. godini

Aktivnosti na rekonstrukciji vodovodne mreže šire zone grada uticale su na to da gubici ostanu na nivou prethodne godine. Monitoring gubitaka vršen je redovnim i planskim mjerenjima - ultrazvučnim mjeracima protoka, pri čemu je utvrđeno smanjenje gubitaka u rekonstruisanoj široj gradskoj zoni. U toku 2025. godine gubici su iznosili 65%.

U 2026. godini planira se rekonstrukcija sledećih saobraćajnica šire zone grada: 20 novembar, Blaža Jovanovića, Vardarska, Miše Cvetkovića, Ivana Milutinovića (Tender Opštine Pljevlja), Ive Lole Ribara, dio ulice Podgorička, Žabljačka, Sretena Tošića, Njegoševa (od II Proleterske do dr Dušana Obradovića), dio ulice III Sandžačke (prema Stražici), Put solidarnosti, Šavnička (od Plužinske do raskrsnice sa ulicom dr Slobodana Dragaševića), dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Šavnička do raskrsnice sa ulicom

Višegradska), dio ulice Bjelopoljska (od raskrsnice Šavničke ulice do ulice dr Slobodana Dragaševića).

3.2 Kvalitet vode

Sistem vodosnabdijevanja u Pljevljima se zasniva na tri izvorišta: Jugoštica, Breznica i Odžak (Mandojevac, Zmajevac, Bezarska vrela), kao i na zahvatu vode sa akumulacije Otilovići.

3.2.1 Tekuće aktivnosti na kontroli kvaliteta vode

Analizu i kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće u Pljevljima u 2025. godini vršili su Institut za javno zdravlje Podgorica i interna laboratorija postrojenja Pliješ. U internoj laboratoriji se svakodnevno vrše osnovne analize fizičko-hemijskih parametara sirove i hlorisane vode. Institut za javno zdravlje Podgorica je vršio uzorkovanje tri puta mjesečno po četiri uzorka za osnovnu analizu, kao i periodično ispitivanje dva puta godišnje po tri uzorka.

U toku 2025. godine Institut za javno zdravlje Podgorica izvršio je 178 fizičko-hemijskih ispitivanja (miris, mutnoća, boja, pH vrijednost, elektroprovodljivost, utrošak kalijum-permanganata, amonijak, hloridi, ostatak isparenja na 105°C, gvožđe, rezidualni hlor, nitrati, nitriti) i 178 mikrobioloških ispitivanja (uk.br. koliformnih bakterije, koliformne bakterije fekalnog porijekla, uk. br. aerobnih mezofilnih bakterija, streptokoke fekalnog porijekla, sulfitoredukujuće klostridije, pseudomonas aeruginosa, proteus vrste).

U toku 2025. godine Institut za javno zdravlje Podgorica izvršio je u okviru periodičnih analiza 6 fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih ispitivanja (temperatura na terenu, temperatura u laboratoriji, boja, miris, ukus, mutnoća, pH vrijednost oksidabilnost, amonijak, slobodan hlor, nitriti, nitrati, fluoridi, elektroprovodljivost, gvožđe, mangan, deterdženti anjonski, fenoli, ukupni organski ugljenik, sulfati, natrijum) i 6 mikrobioloških ispitivanja (escherichia coli, ukupne koliformne bakterije, enterococcus species, pseudomonas aeruginosa, aerobne mezofilne bakterije na 37°C, aerobne mezofilne bakterije na 22°C salmonella, shigella, paraziti i protozoe).

U toku 2025. godine izvršeno je 5.440 mjerenja rezidualnog hlora od strane interne laboratorije Vodovoda Pljevlja.

U toku 2025. godine izvršeno je 2350 mjerenja mutnoće od strane interne laboratorije Vodovoda Pljevlja. Takođe, izvršeno je 1920 mjerenja rezidualnog hlora u gradskoj mreži.

Izvorište	Broj dana
Breznica	20
Jugoštica	10
Pliješ	25

Tabela br. 4. Broj dana sa neispravnom vodom za piće

4 KANALIZACIONI SISTEM

4.1 Tekući radovi u okviru održavanja kanalizacionog sistema

Ekipe iz službe održavanja Društva su u toku 2025. godine, vršile redovno održavanje cjelokupne primarne i sekundarne kanalizacione mreže. Radovi na mreži se sprovode na osnovu planskog djelovanja redovnim propiranjem cjelokupne mreže i glavnog gradskog kolektora, a sve u cilju preventivnog održavanja. Takođe, izvršen je veliki broj urgentnih intervencija na teritoriji grada uz korišćenje specijalizovanog vozila i pomoćne opreme.

4.2 Investicione aktivnosti na unaprijeđenju kanalizacionog sistema

4.2.1 Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Dana 27.04.2023. godine PPOV je dobio Upotrebnu dozvolu na dio objekta, opreme i mašina na liniji vode i liniji mulja, dok linija gasa nije dobila pomenutu dozvolu. Dio linije mulja je u funkciji i vrši se dehidracija i prerada mulja. Postrojenje je ukupno primilo 1.372.968,00 m³ otpadne vode, dok je u recipijent ispušteno 1.275.552,00 m³ prečišćene vode. Kroz postrojenje je obrađeno 1.129,00 m³ aktivnog mulja kroz centrifugalni dekanter i dobijeno 119 koševa finalnog proizvoda (čvrsti mulj), što iznosi oko 476 m³. Zbog velike količine prerađene otpadne vode, dešavali su se česti kvarovi na mašinama i opremi, gdje su zaposleni radnici na PPOV većinu kvarova uspješno sanirali. U prethodnom periodu dolazilo je i do razblaženja SBR bazena, a najviše usled atmosferskih padavina, a sve zbog nerazdvojenosti atmosferske i fekalne kanalizacije, kao i infiltracije podzemnih voda u kanalizacioni sistem što utiče na proces rada i obradu mulja. Rješavanjem ovih problema riješio bi se i problem nedovoljnog kvaliteta ulaznog influenta na PPOV. Takođe, usled pomenutog lošeg kvaliteta ulaznog influenta i nemogućnosti dobijanja neophodnih opterećenja na centrifugalni dekanter, pojavili su se jaki neprijatni mirisi koji su se širili oko postrojenja i koji su uticali na život mještana naselja Židovići. Preko zajednice praktičara Crne Gore uspješno je riješen problem angažovanjem stručnih lica, koja su uradila neophodne analize i dala preporuke razblaženja polielektrolita prije ulaza u centrifugalni dekanter. Nakon toga angažovana je firma CETI za ispitivanje kvaliteta vazduha i novoa buke, i dobijen je izvještaj da su sve analize u zakonski predviđenim vrijednostima.

Važno je napomenuti da je Opština Pljevlja finansirala sve neophodne troškove na PPOV. Svakodnevno su vršene analize popunjenosti SBR bazena, kao i analize ulazne i izlazne otpadne vode u internoj laboratoriji i preko akreditovane firme CETI, koja će i u narednom periodu vršiti zakonski potreban broj analiza.

4.2.2 IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI DEVETA

Na osnovu ponude br. 12-332/25-4723/1 od 09.12.2025. godine izvedeni su radovi na izradi fekalne kanalizacije u ulici Deveta. Ukupna vrijednost izvedenih radova je **6.464,18 €** sa PDV-om.

Izvedeni radovi na fekalnoj kanalizaciji odnosili su se na ugradnju slivničkih PVC kanalizacionih cijevi DN 160 mm SN4 u dužini **L=90 m**, PVC DN 110 mm SN4 u dužini **L=10 m**.

Realizacija ovog projekta obezbjeđuje efikasno odvođenje otpadnih voda do glavnog gradskog kolektora, poboljšanje kvaliteta influenta na PPOV-u, kao i sanitarnu zaštitu naselja odnosno životne sredine.



Slika br.9. Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Deveta

4.2.3 IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI AMOSFERSKE KANALIZACIJE U DIJELU ULICE OSLOBOĐENJA

Na osnovu ponude broj 12-332/25-275/1 od 03.02.2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u dijelu ulice Oslobođenja. Ukupna vrijednost izvedenih radova je **3.388,56 €** sa PDV-om.

Izvedeni radovi na atmosferskoj kanalizaciji odnosili su se na ugradnju PVC kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju DN 160 mm SN4 u dužini od **L=45 m**.

Realizacijom ovog projekta obezbjeđeno je razdvajanja fekalne i atmosferske kanalizacije.

4.2.4 IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE I DRENAŽE U ULICI II PROLETERSKA (IZA ZGRADE GM3)

Na osnovu ponude broj 12-332/25-511/1 od 18.02.2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije i drenaže u ulici II Proleterska (iza zgrade GM 3). Ukupna vrijednost izvedenih radova je **16.079,48 €** sa PDV-om.

Izvedeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije odnosili su se na ugradnju slivničkih PVC cijevi DN 160 mm SN4 u dužini od **L=155 m**; DN 125 u dužini **L=44 m**.

Realizacijom ovog projekta obezbjeđeno je efikasnije prikupljanje i odvođenje atmosferskih otpadnih voda, kao i razdvajanja atmosferske i fekalne kanalizacije.



Slika br.10. Radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije i drenaže u ulici II Proleterske (iza zgrade GM3)

4.2.5 IZVEDENI RADOVI NA RAZDVAJANJU FEKALNE I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U VOLOĐINOJ ULICI (NASELJE KUPUSIŠTE)

Na osnovu ponude broj 12-332/25-446/1 od 11.02.2025. godine i potpisanog ugovora broj 02-332/25-484/1 od 17.02.2025. godine izvedeni su radovi na razdvajanju fekalne i atmosferske kanalizacije u ulici Volođina (naselje Kupusište). Ukupna vrijednost izvedenih radova je **7.524,43 €** sa PDV-om.

Izvedeni radovi odnosili su se na ugradnju kanalizacionih PVC cijevi DN 315 mm SN4 u dužini od **L=24 m**; PVC DN 160 mm u dužini **L=4,09 m**.

Realizacijom ovog projekta obezbjeđeno je efikasnije prikupljanje i odvođenje atmosferskih otpadnih voda, kao i razdvajanja atmosferske i fekalne kanalčizacije.



Slika br.11. Radovi na razdvajanju atmosferske i fekalne kanalčizacije u Vlolođinoj ulici (naselje Kupusište)

4.2.6 IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NA PLATOU MANASTIRA SVETE TROJICE

Na osnovu ponude broj 12-332/25-1251/1 od 30.04.2025. godine i potpisanog ugovora broj 02-332/25-1519/1 od 17.04.2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije na platou manastira Svete Trojice. Ukupna vrijednost izvedenih radova je **47.982,59 €** sa PDV-om.

Izvedeni radovi odnosili su se na ugradnju kanalizacionih PVC cijevi DN 315 mm SN4 u dužini od **L=83,98 m**; PVC DN 200 mm SN4 u dužini **L=26,7 m**; PVC DN 200 mm SN4 u dužini **L=50,98 m**; PVC DN 160 mm SN4 u dužini **L=14,41 m**.

Realizacijom ovog projekta obezbjeđeno je efikasnije prikupljanje i odvođenje atmosferskih otpadnih voda.



Slika br.12. Radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije na platou manastira Svete Trojice

4.2.7 IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI DRENAŽNE KANALIZACIJE NA GRADSKOM GROBLJU RAVNI

Na osnovu ponude broj 12-332/25-4455/1 od 17.11.2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji drenažne kanalizacije na gradskom groblju Ravni. Vrijednost izvedenih radova je **8.389,35 €** sa PDV-om. Radovi su se odnosili na ugradnju drenažne cijevi DN 160 mm u dužini od **L=145 m**.

4.2.8 IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI DRENAŽNE KANALIZACIJE NA GRADSKOM GROBLJU RAVNI (IZNAD PRAVOSLAVNOG GROBLJA)

Na osnovu ponude broj 12-332/25-4933/1 od 18.12.2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji drenažne kanalizacije na gradskom groblju Ravni iznad pravoslavnog groblja. Vrijednost izvedenih radova je **14.281,35 €** sa PDV-om. Radovi su se odnosili na ugradnju drenažne cijevi PVC DN 200 mm u dužini od **L=89 m**; PVC DN 160 mm u dužini od **L=138 m**.




Slika br.13. Radovi na izgradnji drenažne kanalizacije na gradskom groblju Ravni (iznad pravoslavnog groblja)

4.2.9 IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U DIJELU ULICE DR SLOBODANA DRAGAŠEVIĆA (OD RASKRSNICE SA ULICOM JADRANSKA DO RASKRSNICE SA ŠAVNIČKOM ULICOM)

Na osnovu ponude broj 12-332/25-4991/1 od 24.12.2025. godine i potpisanog ugovora broj 02-332/25-5045/1 od 26.12.2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u dijelu ulice dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Jadranska do raskrsnice sa Šavničkom ulicom). Ukupna vrijednost izvedenih radova je **12.001,35 €** sa PDV-om.

Izvedeni radovi odnosili su se na ugradnju kanalizacionih PVC cijevi DN 200 mm u dužini od **L=53,16 m**.

Realizacijom ovog projekta obezbjeđeno je efikasnije prikupljanje i odvođenje atmosferskih otpadnih voda, kao i razdvajanja atmosferske i fekalne kanalizacije.

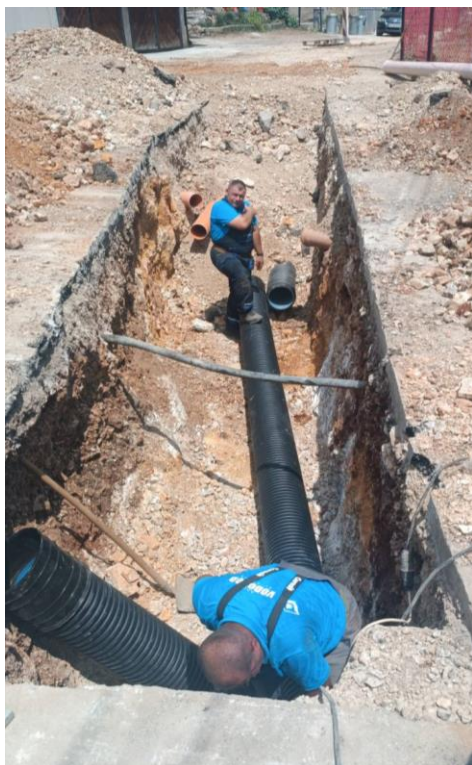

Slika br.14. Radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u dijelu ulice dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Jadranska do raskrsnice sa Šavničkom ulicom)

Zbirna rekapitulacija izvedenih radova na kanalizacionoj mreži

Naziv projekta	Dužina glavne i sekundarne mreže (m)	Vrijednost izvedenih radova (€)
Izvedeni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Deveta	100	6.464,18
Izvedeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u dijelu ulice Oslobođenja	45	3.388,56
Izvedeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije i drenaže u ulici II Proletherske (iza zgrade GM3)	199	16.079,48
Izvedeni radovi na razdvajanju fekalne i atmosferske kanalizacije u Volođinoj ulici (naselje Kupusište)	28,09	7.524,43
Izvedeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije na platou manastira Svete trojice	176,07	47.982,59
Izvedeni radovi na izgradnji drenažne kanalizacije na gradskom groblju Ravni	145	8.389,35
Izvedeni radovi na izgradnji drenažne kanalizacije na gradskom groblju Ravni (iznad pravoslavnog groblja)	227	14.281,35
Izvedeni radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije u dijelu ulice dr Slobodana Dragaševića (od raskrsnice sa ulicom Jadranska do raskrsnice sa Šavničkom ulicom)	53,16	12.001,35
Ukupno	1150,15	116.111,29

Tabela br. 5. Zbirna rekapitulacija izvedenih radova na kanalizacionoj mreži

4.2.10 Aktivnosti u okviru kratkoročnih mjera na rekonstrukciji i sanaciji kanalizacione mreže

Tokom 2025. godine, Društvo je u saradnji sa nadležnim Sekretarijatom za stambeno - komunalne poslove, saobraćaj i vode i Direkcijom za izgradnju i investicije, izvršilo rekonstrukciju i sanaciju kanalizacione mreže u određenim ulicama, kroz izradu drenažnih sistema, sanaciju šahtova i slivnih rešetki. Spisak izvedenih radova naveden je u tabelarnom prikazu.

Opis radova	Vrijednost izvedenih radova u €
Izrada kanalizacionih priključaka na novoizgrađeni kanalizacioni kolektor u Kosaničkoj ulici	1.800,04
Izgradnja kanalizacione mreže DN 160 mm Srdanov grob	7.151,44
Izrada šahte na kanalizacionim priključcima u ulici Oslobođenja i ulici Manastirska	4.257,48
Rekonstrukcija oštećenog kanalizacionog priključka u Orjenskoj i Balkanskoj ulici	3.879,72
Izrada kanalizacionog priključka u Višegradskoj ulici, izrada kanalizacionog priključka za grupu domaćinstava u Kolašinskoj ulici	10.052,28
Rekonstrukcija kanalizacionih priključaka u ulicama Katićevoj, Nikole Pašića, Voja Ćenisijevića	4.845,46
Izrada drenaže u Mojkovačkoj i Volođinoj ulici	2.237,24
Čišćenje odvodnog kanala u ulici Aleksandra Vukovića Vuka	1.872,87
Izrada slivnika u Velenjskoj ulici	1.868,63
Izrada linijske rešetke i podizanje šahti atmosferske kanalizacije u Šavničkoj ulici	2.583,35
Izrada betonskog kanala za atmosferske vode u ulici Ivana Milutinovića	2.894,54
Izrada priključaka za atmosfersku kanalizaciju u ulici Nikole Pašića	1.719,26
Propiranje i čišćenje slivnika atmosferske kanalizacije i drenaže u toku godine	6.505,36
Izvedeni radovi na sanaciji zemljišta oko sportskog poligona OŠ „Boško Buha“	2.147,99
Izvedeni radovi na izgradnji pješačke staze u ulici Šavnička	1.904,47
Ukupno	55.720,13

Tabela br. 6. Rekonstrukcija i sanacija kanalizacione mreže kao kratkoročne mjere

Ukupna vrijednost radova – kanalizacija: 171.831,42 €

4.2.11 Aktivnosti u okviru dugoročnih mjera na rekonstrukciji i sanaciji kanalizacione mreže

Početkom 2022. godine Opština Pljevlja je sprovela aktivnosti na izradi Projekta **"Unaprijeđenje kanalizacione mreže u Opštini Pljevlja (Faza II)"** koji se finansira iz sredstava Evropske unije i to iz WBIF-a. Projektanti angažovani za ovaj projekat su "ENVIROPLAN S.A. Consultants & Engineers" iz Grčke i "VIGORIS ECOTECH" iz Podgorice, a formirana je i Jedinica za implementaciju Opštine Pljevlja u kojoj su angažovani i predstavnici DOO "Vodovoda". Završeno je Idejno rješenje projekta, III Studija izvodljivosti, izrada Glavnog projekta i revizija istog je u toku. Prioritetna mreža obuhvaćena ovim projektom iznosi oko 42 km. uz procijenjene troškove od 9.612.930,00 €.

Izradom projektne dokumentacije stvoriće se uslovi fazne realizacije projekta u cilju efikasnijeg funkcionisanja kanalizacionog sistema grada i poboljšanja kvaliteta dolaznog influenta na Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Idejnim rješenjem je zaključen tehnički pristup kroz sledeće kategorije radova: - KATEGORIJA I – Projektovanje novog kanalizacionog sistema; - KATEGORIJA II – Projektovanje novog sistema za atmosferske vode; - KATEGORIJA III – Hitne intervencije i odvajanje kanalizacione i atmosferske mreže.

Društvo je u 2025. godini prema osnivaču - Opštini Pljevlja izvelo radove (većeg obima) investicione vrijednosti **449.057,29 €** sa PDV-om, a u tabeli br. 7 predstavljamo kumulativni prikaz vrijednosti izvedenih radova na glavnoj i sekundarnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.

Naziv	Vrijednost € sa PDV-om
Vodovod	277.225,87
Kanalizacija	171.831,42
Ukupna investiciona vrijednost	449.057,29

Tabela br. 7. Ukupna investiciona vrijednost: vodovod i kanalizacija prema osnivaču - Opštini Pljevlja

4.2.12 Aktivnosti na poboljšanju tehničke opremljenosti Društva

U saradnji sa Opštinom (Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode) izvršena je nabavka opreme neophodne za rad u skladu sa mogućnostima osnivača što je imalo veliki značaj za Društvo u tehničkom smislu, a samim tim olakšan je i ubrzan proces rada:

- Stator potopne pumpe Weda DN 50 **7.381,00 € sa PDV-om;**
- Hidraulika Weda pumpe DN 50 **9.559,00 sa PDV-om;**
- TriOS mjerač provodljivosti sa sondom **5.626,50 sa PDV-om.**

Takođe, u saradnji sa osnivačem izvedeni su i radovi na poboljšanju i nadogradnji SCADA sistema u okviru kojih je izvršena nabavka i ugradnja sledeće opreme za tekući rad:

- Turbidimetri (ugradnja dva postojeća na PPV Pliješ, nabavka i ugradnja turbidimetra na pumpnoj stanici Breznica) **7.616,76 € sa PDV-om;**
- Frekventni regulator na pumpnoj stanici Potpliješ (pumpa broj 3) **9.628,58 € sa PDV-om;**
- PLC (sistem automatskog hlorisanja na Breznici) **5.665,22 € sa PDV-om;**
- Pozicioneri na filterskim poljima na PPV Pliješ **8.916,20 € sa PDV-om.**

Izvedeni radovi imali su za cilj unapređenje funkcionalnosti, pouzdanosti i efikasnosti rada kompletnog sistema.

5. FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA U 2025. GODINI

5.1. Iskaz o finansijskoj poziciji - Bilans stanja na dan 31.12.2025. godine sa uporednim pokazateljima za 2024. i 2023. godinu

AKTIVA	2025.	2024.	2023.
Nematerijalna ulaganja	3.416,67	5.056,67	6.696,67
Građevinski objekti	765.252,70	765.252,70	765.252,70
Oprema	248.301,43	289.842,88	186.017,65
Postrojenja i oprema u pripremi - PPOV	8.159.981,04	8.159.981,04	8.159.981,04
Zalihe materijala	164.434,05	144.644,69	130.474,15
Dati avansi	25.278,17		
Potraživanja od kupaca	644.793,28	403.503,84	569.198,21
Potraživanja od zaposlenih	2.214,75	10.829,11	12.083,51
Potraživanja za zarade koje se refundiraju (Fond za profesionalnu rehabilitaciju)	160.109,76	136.301,81	78.094,35
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	383.368,48	133.766,24	139.097,93
Aktivna vremenska razgraničenja	1.489,80	1.933,32	1.950,00
UKUPNA AKTIVA	10.558.640,13	10.051.112,30	10.048.846,21
PASIVA	2025.	2024.	2023.
Kapital	9.462.925,83	9.462.925,83	9.462.925,83
Gubitak tekuće godine			(91.671,57)
Dobitak tekuće godine	775.629,39	73.694,53	
Neraspoređeni gubitak iz ranijih godina	(3.363.668,44)	(3.363.668,44)	(2.885.390,83)
Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	94.615,36	20.920,83	20.920,83
Rezervisanja za otpremnine – MRS19	91.765,79		
Rezervisanja za jub. nagrade – MRS19	21.780,85		
Reprogram 2015 – dugoročne obaveze	615.732,61	688.171,69	760.610,77
Reprogram 2022 – dugoročne obaveze		322.124,39	497.828,63
Obaveze za retenciju PPOV	594.273,03	594.273,03	594.273,03
Primljeni avansi			18.128,50

Obaveze prema dobavljačima	49.372,29	279.945,38	288.497,84
Obaveze za neto zarade		105.764,75	118.067,55
Obaveze za zarade iz prethodnog perioda			16.913,49
Obaveze po osnovu ugovora o djelu (neto)	1.433,75	10.814,77	20.130,51
Obaveze za naknade zaposlenim - zimnica	31.139,99		
Obaveze za otpremninu			3.000,00
Obaveze za jubilarne nagrade		360,00	
Obaveze prema članovima Odbora direktora		495,00	180,00
Obaveze za tekuće poreze i doprinose	1.354.269,10	512.488,07	302.084,10
Obaveze po osnovu PDVa	97.152,93	41.338,87	6.088,45
Obaveze za koncesije – za korišćenje voda	91.537,55	36.461,44	22.221,37
Obaveze za koncesije – za zaštitu voda	79.136,33	35.300,30	23.615,51
Rezervisanja (porezi i doprinosi na razliku u zaradama za period 01.04.2017-01.04.2021.)		94.000,00	94.000,00
Reprogram 2015.	72.439,08	72.439,08	72.439,08
Reprogram 2022.		654.010,22	478.305,98
Obaveze po osnovu kamata (zarade 2017-2021)		685,88	28.271,05
Obaveze po osnovu kamata za poreze i doprinose	128.343,87	128.343,87	
Obaveze po osnovu kamata za PDV	334,28	734,64	
Obaveze po osnovu kamata za koncesije	8.746,76	8.746,76	
Naknada Regulatornoj agenciji	4.942,23		(631,42)
Obaveze prema Privrednoj komori CG	5.816,05	6.145,97	6.116,05
Obaveze po osnovu prireza na porez	56.517,78	44.822,20	37.433,19
Ostale obaveze (pomoć, prevoz, predujam, naknada štete)	910,20	3.325,31	300,00
Obaveze po osnovu poreza na dobit	89.114,87	43.749,25	10.035,37
Odloženi prihod po osnovu donacija - EPCG	4.401,90	5.904,23	5.604,36

Odloženi prihod – IPA projekat	98.805,29	114.905,29	123.023,50
Odloženi prihod po sporazumu sa Opštinom Pljevlja	70.007,31	37.148,60	
Odloženi prihod – Opština Pljevlja (IPA projekat)	12.088,02	13.278,02	13.278,02
Razgraničene obaveze za PDV	9.076,13	1.462,54	2.247,02
UKUPNA PASIVA	10.558.640,13	10.051.112,30	10.048.846,21

Zbog jasnijeg prikaza jedan broj pozicija iz bilansa stanja je razdvojen, a jedan zahtjeva dodatna pojašnjenja.

U prilogu je tabela koja prikazuje stalnu imovinu DOO “Vodovod” Pljevlja

POPISNE LISTE - REKAPITULACIJA 2025.														
			stanje po knjigama (iznos)	stanje po popisu (iznos)	otpis %	otpis (do kraja 2019.)	ispravka vrijednosti u 2020.	ispravka vrijednosti u 2021.	ispravka vrijednosti u 2022.	ispravka vrijednosti u 2023.	ispravka vrijednosti u 2024.	ispravka vrijednosti u 2025.	ukupno	sadašnja vrijednost os
I VODOVOD	1.strana		1.394.562,24	1.394.562,24		964.996,99	2.270,88	2.270,88	2.270,88	2.170,64	2.167,14	2.167,14	978.314,55	416.247,69
	2.strana		753.985,86	753.985,86		503.183,60							503.183,60	250.802,26
	3.strana		143.997,97	143.997,97		55.072,04	970,51	127,90	127,90	127,90	123,44	113,56	56.663,25	87.334,72
	4.strana		78.496,55	78.496,55		44.153,82	6.905,13	6.588,76	5.607,75	4.654,97	4.478,67	4.247,59	76.636,69	1.859,86
	5.strana		75.412,46	75.412,46		12.361,04	1.990,38	1.977,11	1.854,50	1.781,25	1.754,99	1.748,89	23.468,16	51.944,30
	6.strana		55.333,02	55.333,02		5.768,79	5.310,53	6.504,97	6.676,72	6.676,72	6.629,12	3.221,77	40.788,62	14.544,40
	7.strana		14.910,05	14.910,05				32,43	631,49	1.415,24	1.506,45	1.506,45	5.092,06	9.817,99
	Ukupno		2.516.698,15	2.516.698,15		1.585.536,28	17.447,43	17.502,05	17.169,24	16.826,72	16.659,81	13.005,40	1.684.146,93	832.551,22
II RADNA ZAJEDNICA	1.strana		132.659,49	132.659,49		97.626,59	78,52	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97.732,21	34.927,28
	2.strana		23.497,50	23.497,50		11.242,39	1.767,42	1.549,14	1.416,00	1.388,15	1.363,20	1.363,20	20.089,50	3.408,00
	3.strana		15.718,90	15.718,90		4.689,16	1.991,49	1.844,91	1.680,81	975,75	760,89	749,61	12.692,62	3.026,28
	4.strana		4.495,08	4.495,08		181,98	783,38	814,24	814,24	817,54	763,75	215,36	4.390,49	104,59
	5.strana		6.096,74	6.096,74			7,50	180,72	587,90	690,16	799,28	987,98	3.253,54	2.843,20
	Ukupno		182.467,71	182.467,71		113.740,12	4.628,31	4.416,11	4.498,95	3.871,60	3.687,12	3.316,15	138.158,36	44.309,35
III POGON	1.strana		275.210,90	275.210,90		113.565,74	31.825,20	31.642,25	31.625,60	27.261,44	24.229,28	9.423,52	269.573,03	5.637,87
	2.strana		154.252,95	154.252,95		5,16	20,66	20,66	23,41	1.689,80	21.414,16		23.197,26	131.055,69
	Ukupno		429.463,85	429.463,85		113.570,90	31.845,86	31.662,91	31.649,01	27.284,85	25.919,08	30.837,68	292.770,29	136.693,56
IV NEMATERIJALNA ULAGANJA	1.strana		11.040,00	11.040,00		2.620,00	220,00		246,00	1.257,33	1.640,00	1.640,00	7.623,33	3.416,67
	Ukupno		11.040,00	11.040,00		2.620,00	220,00		246,00	1.257,33	1.640,00	1.640,00	7.623,33	3.416,67
V PPOV - oprema u pripremi	1.strana		8.159.981,04	8.159.981,04										8.159.981,04
	Ukupno		8.159.981,04	8.159.981,04										8.159.981,04
UKUPNO			11.299.650,75	11.299.650,75		1.815.467,30	54.141,60	53.581,07	53.563,20	49.240,50	47.906,01	48.799,23	2.122.698,91	9.176.951,84

Kada je riječ o zalihama materijala u ukupnom iznosu 164.434,05 eura, iste se odnose na:

1. Zalihe vodovodnog i kanizacionog materijala i auto dijelova.....158.932,29 €;
2. Alat i inventar na zalihama.....493,87 €;
3. Auto gume na zalihama.....2.174,50 €;
4. HTZ zalihe.....2.833,39 €.

Potraživanja od kupaca iznose 1.028.363,47 eura, dok ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca iznosi 383.570,19 eura. Potraživanja od fizičkih lica na 31.12.2025. godine, nakon izvršenog obezvređenja u skladu sa standardom MSFI 9, iznose 86.859,58 eura, a potraživanja od pravnih lica 557.933,70 eura.

Potraživanja od zaposlenih se odnose na potraživanja za ugalj (1.702,76 eura), depozit u korisničkom servisu (200,00 eura) i potraživanja za usluge mobilne telefonije (311,99 eura).

Potraživanja za zarade koje se refundiraju se odnose na potraživanja za zarade lica sa invaliditetom koje pokriva Fond za profesionalnu rehabilitaciju Crne Gore. Društvo ima problem kod naplate navedenih potraživanja iz razloga što nije redovno izmirivalo obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Da bi potraživanje bilo naplaćeno potrebno je dostaviti potvrdu od strane Poreske uprave Crne Gore o plaćenim porezima i doprinosima.

Aktivna vremenska razgraničenja se odnose na unaprijed plaćene premije osiguranja.

Kada je riječ o kapitalu ovdje treba naglasiti da navedena pozicija nije usaglašena sa CRPS (Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore) i ista treba biti usaglašena u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima (osnova za mišljenje sa rezervom u izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu).

U 2025. godini Društvo prvi put knjiži obaveze za rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenih obračunate u skladu sa MRS 19, na osnovu izvještaja ovlašćenog aktuara.

Kada su u pitanju obaveze, najveći iznos se odnosi na obaveze po osnovu poreza i doprinosa u ukupnom iznosu 2.042.440,79 eura. Od tog iznosa po osnovu reprograma iz 2015. godine obaveza iznosi 688.171,69 eura, od čega iznos od 72.439,08 eura dopijeva za naplatu u 2026. godini. Reprogram iz 2022. godine je raskinut na zahtjev DOO »Vodovod« Pljevlja kako bi mogli da podnesemo zahtjev za reprogram poreskog potraživanja u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja jedinice lokalne samouprave, fonda, javne ustanove i privrednog društva čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25 od 30.12.2025).

Pojašnjenje zahtjevaju obaveze po osnovu koncesija i obaveze po osnovu PDV-a iz razloga što je dio navedenih obaveza bio obuhvaćen reprogramom iz 2022. godine i raskidom reprograma one se prenose na tekuće obaveze. Tako je iznos od 75.034,92 eura prenijet na obaveze po osnovu PDV-a, iznos od 36.426,23 eura na obaveze po osnovu naknade za korišćenje voda, a iznos od 27.065,34 eura na naknadu za zaštitu voda od zagađivanja. Ovdje treba napomenuti da će obaveza koja se odnosi na PDV biti obuhvaćena novim reprogramom, dok obaveze koje se odnose na koncesije nisu obuhvaćene novim Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja.

Obaveze prema dobavljačima iznose 49.372,29 eura. U prilogu je tabela u kojoj je prikazano 10 dobavljača kojima Društvo duguje na dan 31.12.2025. godine po opadajućoj skali.

NAZIV-GRAD	SALDO
TIM COMPANY DOO - PLJEVLJA	4.407,43
JUGOPETROL - KOTOR	4.293,61
PROTEKTA PRO DOO - BAR	4.283,40
SIGILUM CO DOO - PODGORICA	3.351,14
MCR GLOBEX GROUP D.O.O. - BEOGRAD	3.280,66
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE - PODGORICA	2.808,38
GAMA KOM - PLJEVLJA	2.416,66
ŽITOPRODUKT A.D. - PLJEVLJA	2.102,57
RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA - PLJEVLJA	1.696,67
AROMA DOO - PLJEVLJA	1.640,44

5.2. Iskaz o ukupnom rezultatu – Bilans uspjeha za period 01.01.2025 - 31.12.2025. godinu sa uporednim pokazateljima za 2024. godinu i planom za 2025. godinu

		OSTVARENO 2025	PLAN 2025	OSTVARENO 2024
I	UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	3.190.335,93	2.623.300,00	2.450.341,53
1.	POSLOVNI PRIHODI	936.916,13	853.800,00	1.005.182,52
	Prihod od prodaje vode – fiksni dio	145.602,41	145.000,00	161.328,09
	Prihod od prodaje vode – varijabilni dio	666.557,98	596.000,00	710.582,81
	Prihod od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda – fiksni dio	15.482,57	15.400,00	17.136,79
	Prihod od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda – varijabilni dio	109.273,17	97.400,00	116.134,83
2.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	2.253.419,80	1.769.500,00	1.445.159,01
	Izvedeni radovi i usluge	507.508,45	350.000,00	850.961,45
	Subvencija Opštine Pljevlja	1.120.791,46	1.000.000,00	
	Subvencija - Fond za profesionalnu rehabilitaciju	83.479,73	35.000,00	70.107,01
	Zarade zaposlenih u PPOV Židovići, javni radovi	364.242,21	310.000,00	386.651,66
	Prihod od prodaje tehničke vode	53.396,30	40.000,00	55.128,84
	Usluge mehanizacije	36.481,56	30.000,00	45.442,97
	Priključak, registracija	2.194,41	2.000,00	1.818,32
	Prodaja materijala	160,28	500,00	63,26
	Prihodi od uslovljenih donacija-EPCG	1.502,33		4.700,13
	Prihod od uslovljenih donacija – opština Pljevlja	59.139,12		9.787,30
	Prihod od donacija – IPA projekat	17.290,00		8.119,43
	Prihodi od smanjenja obaveza	3.394,78		5.922,66
	Prihodi od usklađivanja vrijednosti potraživanja	1.494,32		285,13
	Ostali prihodi (kamate, viškovi materijala, prihodi od prinudne naplate, nelegalna potrošnja)	2.344,85	2.000,00	6.170,85
II	UKUPAN RASHOD	2.325.591,67	2.468.500,00	2.332.897,75

1.	Troškovi materijala	246.345,53	385.000,00	281.295,42
	Nabavka materijala	194.346,20	220.000,00	226.978,46
	Troškovi električne energije	2.948,90	110.000,00	3.239,47
	Troškovi goriva i grijanja	49.050,43	55.000,00	51.077,49
2.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostala lična primanja	1.640.201,72	1679.000,00	1.624.103,98
	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto I)	1.480.099,85	1.527.000,00	1.452.535,00
	Troškovi poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ostala lična primanja na teret poslodavca	21.803,30	22.000,00	80.444,51
	Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima (agencija za privremeno ustupanje zaposlenih)	18.251,17	20.000,00	21.834,78
	Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora	13.944,67	20.000,00	7.276,19
	Ostali lični rashodi i naknade (prevoz, otpremnine, jubilarne nagrade, dnevnice i troškovi prevoza na službenom putu, Ishrana na terenu i ostale naknade troškova zaposlenim)	101.672,46	75.000,00	62.013,50
	Naknade za rad komisija	4.430,27	15.000,00	
3.	Troškovi proizvodnih usluga	71.932,89	95.000,00	37.246,61
	Troškovi transportnih i PTT usluga	10.219,33	10.000,00	8.998,07
	Troškovi tekućeg održavanja	58.613,09	50.000,00	17.204,42
	Troškovi tekućeg održavanja - PPOV			6.476,65
	Troškovi zakupnina	2.755,47	5.000,00	3.151,47
	Troškovi drugih proizvodnih usluga	345,00	30.000,00	1.416,00
4.	Troškovi amortizacije	48.799,23	55.000,00	47.927,83
	Troškovi amortizacije	48.799,23	55.000,00	47.927,83
5.	Troškovi rezervisanja	113.546,64		
	Troškovi rezervisanja za otpremnine zaposlenih	91.765,79		
	Troškovi rezervisanja za jubilarne nagrade zaposlenih	21.780,85		
5.	Nematerijalni troškovi	157.944,03	151.500,00	155.655,12
	Troškovi usluga računovodstva i revizije	3.750,00	4.000,00	2.500,00
	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	160,00	1.000,00	500,00

	Troškovi analiza vode	20.026,60	25.000,00	20.590,19
	Troškovi advokatskih usluga	3.241,50	U okviru ostalih nematerijalnih troškova	2.395,20
	Troškovi komunalnih usluga (čistoća za upravu, pogon i PPOV)	13.808,31	15.000,00	13.829,64
	Troškovi reprezentacije	4.644,91	4.000,00	3.649,10
	Troškovi premije osiguranja	7.841,68	10.000,00	9.756,53
	Troškovi platnog prometa	5.413,48	5.000,00	4.062,61
	Troškovi članarina	5.546,45	6.000,00	5.039,77
	Troškovi poreza (koncesije, carine)	45.472,39	40.000,00	42.526,72
	Troškovi doprinosa (Regulatorna agencija)	8.442,23	U okviru ostalih nematerijalnih troškova	8.020,20
	Sudski troškovi i troškovi vještačenja	7.308,51	10.000,00	6.269,71
	Takse (administrativne, sudske i lokalne)	1.383,14	1.000,00	1.031,47
	Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima	214,88	500,00	99,17
	Troškovi IPA projekta	3.125,00		8.208,21
	Ostali nematerijalni troškovi	27.564,95	30.000,00	27.176,60
6.	Finansijski rashodi	628,86	3.000,00	140.498,46
	Rashodi kamata po osnovu kredita i finansijskog lizinga			
	Rashodi kamata po obavezama iz dužničko-povjerilačkih odnosa i zatezne kamate	628,86	3.000,00	2.673,19
	Kamata za poreze i doprinose			128.343,87
	Kamata po osnovu PDVa			734,64
	Kamata po osnovu koncesija			8.746,76
7.	Ostali rashodi	46.192,77	100.000,00	46.170,33
	Rashodi po osnovu direktnih otpisa			22.778,10
	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	6.166,66		8.444,00
	Naknade štete drugim licima	3.907,51		5.617,50
	Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja	8.009,53		4.389,68
	Rashodi iz prethodnih izvještajnih perioda (razlika u zaradi i kamate za period 01.04.2017-01.04.2021.godine)	27.677,48		4.595,68
	Ostali rashodi(gubitak od rashodovanja, manjkovi	431,59		345,37

	materijala, ispravke materijalno beznačajnih grešaka)			
I - II	REZULTAT	864.744,26	154.800,00	117.443,78
	Tekući porez na dobit	89.114,87		43.749,25
	DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA	775.629,39		73.694,53

Kao i kod bilansa stanja i kod bilansa uspjeha je jedan broj pozicija razdvojen zbog jasnijeg prikaza.

5.3. KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2025. GODINE

Stepen stručne spreme	Broj izvršilaca	žene	muškarci
VII - VI	16	9	7
V	1	-	1
IV	54	29	25
III	34	2	32
I - II	9	-	9
Ukupno:	114	40	74

Na dan 31.12.2025. godine u Društvu je angažovano 114 radnika na neodređeno radno vrijeme.

Od navedenog broja radnika na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda je angažovano 26, za koje u skladu sa Ugovorom o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda troškove bruto zarada nadoknađuje Opština Pljevlja.

Broj radnika po mjesecima

Mjesec	Broj radnika
januar	116
februar	115
mart	115
april	115
maj	115
jun	115
jul	115
avgust	115
septembar	114
oktobar	114
novembar	114
decembar	114
PROSJEK:	114,75

5.4. Analiza prihoda

U skladu sa članom 54 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. List Crne Gore", 55/16, 74/16, 2/18, 66/19, 140/22) cijenu komunalne usluge utvrđuje vršilac komunalne djelatnosti po prethodno pribavljenoj saglasnosti skupštine jedinice lokalne samouprave. Vršilac regulisane komunalne djelatnosti u skladu sa članom 55 stav 2 uz zahtjev za davanje saglasnosti podnijetom skupštini jedinice lokalne samouprave dostavlja i saglasnost Agencije na predlog cijene. Cijene za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti (javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda) se utvrđuju u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. Ova metodologija se zasniva na principu „povrata troškova“, po kojem se utvrđuje cijena usluge koja obezbjeđuje pokrivanje opravdanih troškova poslovanja u obavljanju regulisane komunalne djelatnosti.

Cijene usluga za 2025. godinu, na koje je data saglasnost od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, su iznosile za:

a) Javno vodosnabdijevanje:

- Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za fizička lica: 3,6142 €;
- Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za pravna lica: 3,6142 €;
- Varijabilni dio cijene za fizička lica: 1,6016 €/m³;
- Varijabilni dio cijene za pravna lica: 1,6016 €/m³;

b) Prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda:

- Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za fizička lica: 0,1885 €;
- Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za pravna lica: 0,1885 €;
- Varijabilni dio cijene za fizička lica: 0,1093 €/m³;
- Varijabilni dio cijene za pravna lica: 0,1093 €/m³.

Budući da Skupština Opštine Pljevlja nije dala saglasnost na cijene usluga na koje je Regulatorna agencija dala saglasnost, DOO "Vodovod" Pljevlja je u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima (Član 56a stav 1) u 2025. godini primjenjivao privremene cijene koje su iznosile za:

a) Javno vodosnabdijevanje:

- Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za fizička lica: 1,4306 €;
- Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za pravna lica: 2,0099 €;
- Varijabilni dio cijene za fizička lica: 0,5749 €/m³;
- Varijabilni dio cijene za pravna lica: 1,0018 €/m³;

b) Prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda:

- Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za fizička lica: 0,1583 €;
- Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za pravna lica: 0,2224 €;
- Varijabilni dio cijene za fizička lica: 0,0971 €/m³;
- Varijabilni dio cijene za pravna lica: 0,1693 €/m³.

Prihod po osnovu usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda u 2025. godini je iznosio 936.916,13 €. Navedeni prihod se vezuje za broj korisnika, količinu isporučene vode za piće i prihvaćene komunalne otpadne vode i privremene cijene koja se primjenjivala u 2025. godini . Prilikom utvrđivanja cijena za 2025. godinu predviđena je bila količina od 879.000 m³ tretirane vode koja će biti isporučena korisnicima (666.500 m³ fizička lica, 212.500 m³ pravna lica). Procjena je urađena na osnovu isporuke u

prethodnom periodu. Prema konačnim podacima, u 2025. godini je fakturirano 977.530 m³ tretirane vode (732.564 m³ fizička lica, 244.966 m³ pravna lica). Slična situacija je i sa količinom prihvaćene komunalne otpadne vode, predviđeno je bilo 846.000 m³ (634.000 m³ fizička lica, 212.000 m³ pravna lica), a fakturirano 943.363 m³ (698.590 fizička lica, 244.773 m³ pravna lica).

Broj korisnika i količina fakturirane vode i kanalizacije za fizička i pravna lica po godinama od uvođenja regulacije cijena:

	USLUGE		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Fizička lica	Vodosnabdijevanje	Broj korisnika (prosjeak)	7.256	7.288	7.290	7.306	7.320
		Fakturisana količina	718.181	738.851	666.952	721.293	732.564
	Prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda	Broj korisnika (prosjeak)	7.000	6.975	6.981	6.995	7.017
		Fakturisana količina	686.643	711.947	634.061	686.410	698.590
Pravna lica	Vodosnabdijevanje	Broj korisnika (prosjeak)	844	835	813	820	827
		Fakturisana količina	219.040	221.968	212.671	224.437	244.966
	Prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda	Broj korisnika (prosjeak)	836	818	795	800	807
		Fakturisana količina	213.207	221.534	212.489	223.664	244.773

Iz prethodne tabele se može izračunati prosječna mjesečna potrošnja vode za fizička lica po godinama:

	2021. godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Prosječna mjesečna potrošnja vode fizičkih lica (m ³)	8,25	8,45	7,62	8,23	8,34

Ostali poslovni prihodi se sastoje od:

- Prihoda od izvedenih radova i usluga koje se najvećim dijelom finansiraju iz budžeta Opštine Pljevlja za unapređenje i razvoj hidrotehničkih instalacija. Manji dio, u iznosu od 6.957,25 eura, se odnosi na prihod od usluga i radova koji su izvode za potrebe trećih lica;
- Prihoda od subvencije Opštine Pljevlja koji se odnose na primjenu privremenih cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda. Subvencija se utvrđuje kao razlika prihoda koje bi vršilac regulisane komunalne djelatnosti ostvario da je data saglasnost na predložene cijene tj. cijene na koje je saglasnost dala Regulatorna agencija i ukupnog iznosa fakturiranih usluga primjenom privremenih cijena.

- Prihoda od subvencije zarada za jedanaest zaposlenih po osnovu ugovora i rješenja o dodjeli subvencija zarada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na teret Fonda za profesionalnu rehabilitaciju;
- Prihoda od zarada zaposlenih u Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Židovići, na osnovu Ugovora br. 01-5016 od 19.11.2020. godine o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda zaključenim sa Opštinom Pljevlja. U skladu sa članom 6 stav 1 tačka 1 Ugovora, ugovorne strane su saglasne da će Opština Pljevlja nadoknaditi DOO "Vodovod" Pljevlja troškove bruto zarada zaposlenih u PPOV Židovići, do momenta uvođenja tih troškova u cjenovnik za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti;
- Prihoda od prodaje tehničke vode, čija je cijena – varijabilni dio u 2025. godini na osnovu odluke Odbora direktora iznosila za pravna lica 0,97 €/m³, a za fizička lica 0,55 €/m³;
- Prihoda od usluga mehanizacije, koji se najvećim dijelom odnosi na usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama i prodaje vode putem cistjerne;
- Prihoda od naknada za priključenje i registraciju;
- Prihoda od prodaje materijala;
- Prihoda od uslovljenih donacija preko IPA projekta, od strane Elektroprivrede Crne Gore i Opštine Pljevlja;
- Prihoda od usklađivanja vrijednosti potraživanja po MSFI 9;
- Prihoda od kamate (3,20 eura), viškova materijala (15,42 eura) i prinudne naplate (2.326,23 eura).

5.5. Analiza rashoda

Ukupni rashodi u 2025. godini iznose 2.325.591,67 eura, a čine ih:

- **Troškovi materijala** koji obuhvataju troškove nabavke materijala, troškove električne energije i goriva. Troškovi nabavke materijala obuhvataju:
 1. Troškove sirovina i osnovnog materijala 166.871,49 €;
 2. Troškove materijala za održavanje higijene 1.551,85 €;
 3. Troškove kancelarijskog materijala 7.528,21 €;
 4. Troškove alata i inventara 3.158,67 €;
 5. Troškove HTZ-a..... 10.204,22 €;
 6. Troškove auto guma..... 5.031,76 €;

Obavezu plaćanja računa za utrošenu električnu energiju za pumpna postrojenja preuzela je Opština Pljevlja, tako da je DOO "Vodovod" Pljevlja u 2025. godini imao trošak električne energije za upravnu zgradu, korisnički servis i pogon. Troškovi goriva za vozila iznose 45.512,43 eura, a troškovi grijanja 3.538,00 eura.
- **Troškovi zarada, naknada zarada i ostala lična primanja** u iznosu 1.640.201,72 eura. Opština Pljevlja je nadoknadila troškove bruto zarada za radnike na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u iznosu 384.242,21 eura. Troškovi naknada po ugovoru o djelu iznose 9.007,96 eura, a troškovi angažovanja lica preko agencije za privremeno ustupanje zaposlenih iznose 9.243,21 eura. Ostali lični rashodi i naknade obuhvataju: troškove prevoza na radno mjesto i sa radnog mjesta (10.202,63 eura), otpremninu za sporazumni raskid radnog odnosa (14.392,93 eura), jubilarne nagrade (2.095,66 eura), dnevnice za službena putovanja (4.080,10 eura), naknade troškova prevoza na službenom putu (9.171,27 eura), troškove smještaja i ishrane na službenom putu (2.184,16 eura),

naknadu zaposlenim ženama za 8. Mart (3.200,00 eura), naknade za rođenje djeteta po kolektivnom ugovoru (1.011,61 eura), naknadu za zimnicu (31.139,99 eura), pomoć u skladu sa kolektivnim ugovorom – smrt zaposlenog ili člana uže porodice (6.779,48 eura), ostale naknade zaposlenim po osnovu odluka Odbora direktora (6.924,93 eura), ostale naknade zaposlenim – nagrada Opštine Pljevlja (5.400,00 eura) i troškove ishrane radnika na terenu (5.089,70 eura);

- **Troškovi proizvodnih usluga** ostvareni u iznosu od 71.932,89 eura. Troškovi transportnih i PTT usluga obuhvataju troškove usluga prevoza u iznosu 604,82 eura i troškove usluga mobilne telefonije, interneta i poštanske usluge u iznosu 9.614,51 eura. Troškovi tekućeg održavanja obuhvataju i troškove održavanja tuđih osnovnih sredstava (oprema koju Društvo koristi) u iznosu 29.764,32 eura. Troškovi zakupnina obuhvataju zakup poslovnog prostora (2.521,20 eura) i zakup parkinga (234,27 eura). Troškovi drugih proizvodnih usluga obuhvataju troškove izrade i prepravke šaht poklopaca i slivnih rešetki;
- **Troškovi amortizacije** u iznosu od 48.799,23 eura;
- **Nematerijalni troškovi** u iznosu od 157.944,03 eura. Troškovi komunalnih usluga obuhvataju usluge "Čistoće" doo Pljevlja za upravnu zgradu i pogon u iznosu 4.728,03 eura i za PPOV Židovići u iznosu 9.080,28 eura koje pokriva Opština Pljevlja. Troškovi reprezentacije iznose 4.644,91 eura, od čega za Odbor direktora 1.826,65 eura. U 2025. godini naknada za korišćenje voda je iznosila 23.832,02 eura, a naknada za zaštitu voda od zagađivanja 21.420,37 eura. Ostali nematerijalni troškovi obuhvataju troškove usluga agencije za privremeno ustupanje zaposlenih (820,00 eura), troškove neproizvodnih usluga (sanitarna zaštita i ispitivanje parametara kvaliteta otpadnih voda) – PPOV Židovići (5.454,24 eura), nabavku časopisa - Poreski savjetnik i RRF magazin (250,00 eura), sponzorstvo (700,00 eura), novčanu pomoć (3.300,00 eura), troškove reklame (660,00 eura), održavanja softvera (6.192,00 eura), usluga traženja kvarova na vodovodnoj mreži (7.950,00 eura), fiskalizacije, godišnji pregled digitalnih tahografa, produžetak domena, ovjera dokumentacije, sistematski pregled i dr.
- **Finansijski rashodi** obuhvataju rashode kamata po osnovu obaveza iz dužničko-povjerilačkih odnosa i zatezne kamate.
- **Ostali rashodi** obuhvataju rashode za kazne za privredne presteupe i prekršaje, naknade štete drugim licima, rashode po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja, rashode iz prethodnog izvještajnog perioda – razlika u zaradi i kamate za period 01.04.2017-01.04.2021. godine, gubitke od rashodovanja opreme (121,99 eura), manjkove materijala (1,60 euro), rashode po osnovu rashodovanja zaliha materijala (308,00 eura).

Finansijski rezultat

Bilans uspjeha ukazuje da je u 2025. godini ostvaren pozitivan finansijski rezultat, tj. dobitak prije oporezivanja u iznosu od 864.744,26 eura. Porez na dobit za 2025. godinu iznosi 89.114,87 eura, tako da dobitak nakon oporezivanja iznosi 775.629,39 eura.

6 ZAKLJUČAK

Na osnovu svega navedenog u Izvještaju o radu DOO „Vodovod“ Pljevlja za 2025. godinu može se zaključiti da je Društvo preduzelo značajne i konkretne mjere u cilju stabilizacije i unapređenja poslovanja. Nakon niza godina negativnih finansijskih rezultata, u 2025. Godini, kao i u prethodnoj, Društvo bilježi pozitivne finansijske rezultate. Bilans uspjeha ukazuje da je u 2025. godini ostvaren pozitivan finansijski rezultat, tj. dobitak prije oporezivanja u iznosu od 864.744,26 eura. Porez na dobit za 2025. godinu iznosi 89.114,87 eura, tako da dobitak nakon oporezivanja iznosi 775.629,39 eura.

Tokom prethodne godine Društvo je uspješno i kontinuirano vršilo snabdijevanje korisnika vodom za piće, uz redovno praćenje i kontrolu kvaliteta vode, o čemu je javnost blagovremeno informisana. Takođe, djelatnosti prikupljanja i odvođenja otpadnih, fekalnih i atmosferskih voda obavljane su uredno i svakodnevno, uz sprovođenje redovnih aktivnosti na održavanju, propiranjju i čišćenju kanalizacione mreže.

Ostvareni rezultati predstavljaju dobru osnovu za dalji razvoj i realizaciju planiranih aktivnosti u narednom periodu sa ciljem dugoročne održivosti.

IZVRSNI DIREKTOR

Mladen Jaćimović, dipl.oficir policije

The image shows a handwritten signature in blue ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue official stamp. The stamp contains the text "DOO 'VODOVOD' PLJEVLJA" around the perimeter and "POSLOVNO MJEŠTO" in the center.
