



D.O.O.
VODOVOD
PLJEVLJA


Ul. Kralja Petra I br. 29, 84210 Pljevlja
T: +382 (0)52 300 156
F: +382 (0)52 300 157
M: +382 (0)67 005 444
E: pwodovod@gmail.com
W: www.vodovodpljevlja.com

PRVA: 535-10504-92
NLB: 530-14722-79
ATLAS: 505-8407-70
CKB: 510-11466-77
PIB: 02343762
PDV: 50/31-00339-5

ZAVRŠENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI UL.OMLADINSKA I DIJELA UL.TANASIJA PEJATOVIĆA

DOO“Vodovod“ (IZVOĐAČ) u saradnji sa Opštinom Pljevlja –Direkcija za izgradnju i investicije (INVESTITOR) izvelo radove na rekonstrukciji vodovodne mreže ul.Omladinske i dijela ulice Tanasija Pejatovića (br.ugovora 12-333/20-78/2 od 09.04.2020 god). Vrijednost izvedenih radova iznosi oko **54.000,00€**. Izvedeni radovi su se odnosili na ugradnju cijevi od polietilena PEHD klase za glavni cjevovod DN 110 kupne dužine **404 m** , za sekundarnu mrežu DN 63,DN 32 ukupne dužine **306 m**.Izvedeni radovi na vodovodnoj mreži imali su za cilj zamjenu dotrajalog cjevovoda, povećanje profila ,stabilizaciju pritiska i smanjenje gubitaka i kvalitetnije vodosnadbijevanje.

Rekonstrukcijom Omladinske i dijela ul. Tanasija Pejatovića realizovana je kompletna rekonstrukcija centralnog jezgra grada kao prioritetna zona u cilju smanjenja gubitaka na mreži.Stogasu uperiodu od 2014. do2020. godine, rekonstruisanesusljedecuulice: 1. Decembar, Voja Đenisijevića, Boška Buhe, III Sandžačke, Volodina, Tršova, Kralja Petra, Miloša Kneževića, MilošaTošića, Tanasija Pejatovića, Mirka Pejatovića, Omladinska, Glasinačka, Principova, a ove godine nastavak Omladinska I Tanasija Pejatovića. Monitoring gubitaka vršen je redovnim I planskim mjerenjima – ultrazvučnim mjeračima protoka, pri čemu je utvrđeno smanjenje gubitaka u rekonstruisanoj zoni.

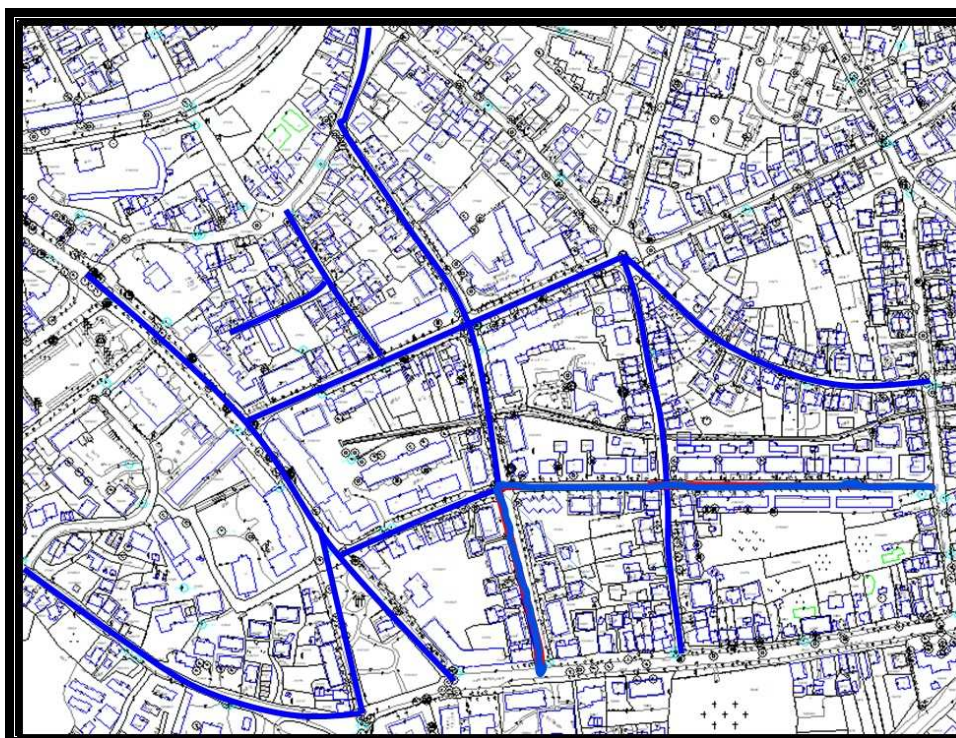

Prikaz presjeka stanja rekonstruisane vodovodne mreže u centralnom dijelu grada





U toku izvođenja radova



*Nakon završetka radova
Rekonstrukcija vodovoda u ul. Omladinskoj I Tanasija Pejatovića*
